



СОГЛАСОВАНО:

Начальник ГКУ РО « Спасское лесничество»

И.В. Егоров

Подпись

Ф.И.О. начальника лесничества

«15» января 2020 г.

## ПРОЕКТ ухода за лесами

### Прореживание

(наименование вида мероприятий ухода за лесами (проходные рубки, рубки прореживания, рубки сохранения лесных насаждений, рубки обновления лесных насаждений, рубки переформирования лесных насаждений, рубки реконструкции, ландшафтные рубки в защитных лесах)

Субъект Федерации Рязанская область Лесной район Хвойно-широколиственный  
Лесничество Спасское Участковое лесничество Комсомольское Номер квартала 62  
Номер выдела 22 Площадь лесного участка 4,3 га Категория защитности лесов зеленые зоны

Лесорастительные условия:

Рельеф слабоволнистый

Почва свежая, подзолистая, В2

(тип, степень увлажнения, механический состав)

Группа типов леса, тип лесорастительных условий ССЛЖ

Планируемое время проведения рубки с «01» апреля 2020 г. по «31» декабря 2020 г.

Планируемое время учета работ с «01» апреля 2020 г. по «31» декабря 2020 г.

Планируемое время оценки результатов с «30» октября 2020 г. по «31» декабря 2020 г.

Исходная (до проведения мероприятий) и проектируемая (после проведения мероприятий) характеристика насаждения:

Характеристика	Состав древостоя	Диаметр	Высота	Сомкнутость (полнота)	Запас сырораств. леса на 1 га, куб.м	Подрост: состав, возраст, высота, кол-во, тыс/га
исходная	5СЗБ2Ос	22,18,20	21,22,21	0,8	310	-
проектируемая	6С2Б2Ос	22,18,20	21,22,21	0,6	250	-

Характеристика вырубаемой части насаждения деревья мешающие росту и формированию крон, отобранных лучших и вспомогательных деревьев; деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, поврежденные вредными организмами, животными; деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны.

Основные нормативы мероприятия:

Интенсивность рубки 20 %

Минимальная сомкнутость крон -

Сумма площадей сечений -

Минимальная полнота: до ухода 0,8 после ухода 0,6


Объем вырубаемой древесины (по породам) Б- 169, Ос - 74, С - 9, Олч- 8.

Технология выполнения работ по уходу за лесами:

1. Подготовительные работы: разметка в натуре погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров, производственных и бытовых площадок, разметка мест размещения лесных складов, рубка деревьев на погрузочных пунктах, трассах магистральных и пасечных волоков, рубка аварийных деревьев за границей лесосеки, угрожающих безопасной работе, установка информационных знаков.
2. Основные лесосечные работы: валка лесных насаждений ( в т.ч. спиливание, обрубка сучьев, раскрытие севка на сортименты, трелевка к месту складирования древесины).
3. Заключительные лесосечные работы: очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.

Абрис лесосеки

с указанием основных элементов (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты)  
 М 1:10000

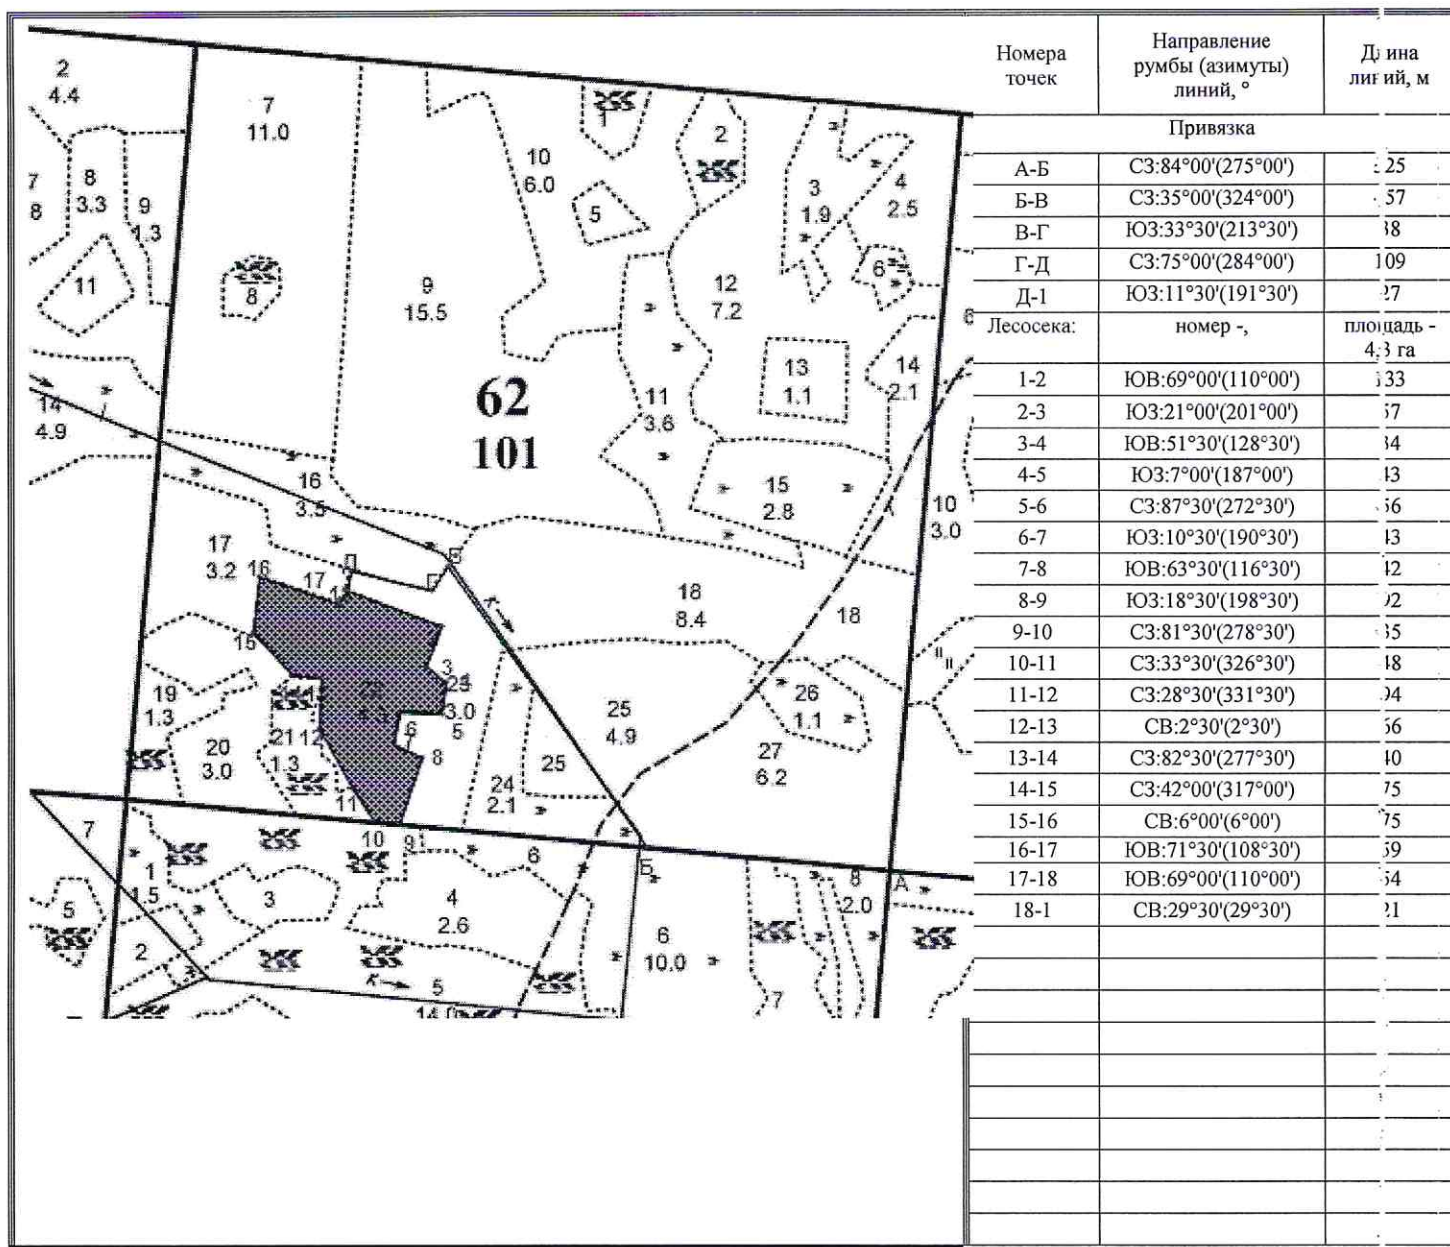

Условные обозначения	
Граница лесосеки	

Лицо, ответственное за составление проекта \_\_\_\_\_

Контактный рабочий номер \_\_\_\_\_

8-4912-28-81-61

подпись

Ф.И.О.

*Чирякин СВ*
